



**Gesuchsteller/in, Bauleitung**

**Gesuchsteller/in:**

Adresse:

Telefon:

**Bauherrschaft:**

Adresse:

(Rechnungsempfänger)

Telefon:

**Bauleitung:**

Ansprechperson:

Adresse:

Telefon:

Telefon:

**Projekt**

**Grund/ Zweck:**

**Strasse/ Bereich**

**Dauer von:**

**bis:**

**Ausführender Unternehmer**

**W. Graf Tiefbau AG, 4463 Buus**

**Kontaktdaten:**

Kontaktperson:

Mail:

Telefon Büro:

Herr Fabian Cervi

info@graf-tiefbau.ch

061 841 18 41

**Ruepp AG Bauunternehmung, 4466 Ormalingen**

**Kontaktdaten:**

Kontaktperson:

Mail:

Telefon Büro:

Herr Ramon Völlmin

info@rueppag.ch

061 985 90 20

**Weisungen für die Gesuchseingabe**

1. Das Gesuch ist mindestens zwei Wochen im Voraus einzureichen.
2. Dem Gesuch sind zwei Situationspläne mit Eintrag der beanspruchten Fläche beizulegen.
3. Das Gesuch ist der Gemeindeverwaltung einzureichen.
4. Die Arbeiten müssen durch einen der aufgeführten Unternehmer ausgeführt werden.
5. Sämtliche Leitungen müssen durch das Büro Sutter Ingenieure eingemessen werden.

**Unterschriften**

Ort Datum Gesuchsteller/in \_\_\_\_\_

Ort Datum Bauherrschaft \_\_\_\_\_

**Bewilligung durch den Gemeinderat**

Das Gesuch für Grabarbeiten in

Gemeindestrassen und Wegen wird

 bewilligt nicht bewilligt

**EINWOHNERGEMEINDE RICKENBACH**

Ressortleiter Strassen: Die Verwalterin: Rickenbach, \_\_\_\_\_

Original an: Gesuchsteller/in

Kopien an: Bauherrschaft

Ausführender Unternehmer



### Zuständigkeiten

Für die Werke sind folgende Organe, bei welchen direkte Erkundigungen einzuholen sind, zuständig:

a) Vermessungsbüro	Sutter Ingenieure AG	061 935 10 20
b) Elektrizität	EBL Liestal	061 926 11 11
c) TV	EBL Liestal	061 926 11 11
d) Telefon:	Swisscom	
e) Wasserversorgung	Brunnmeister Bernhard Erb	079 257 63 93
f) Kanalisation	Gemeindeverwaltung	061 981 32 52

Aktuelle Leitungspläne sind bei der Firma Sutter Ingenieure AG einzuholen.

### Tarife


Die Tarife für die Grabarbeiten, Absicherung der offenen Gräben und Wiederinstandstellung geben ihnen die Unternehmer auf Anfrage bekannt (Die jeweils publizierte Jahresofferte hat für alle Firmen Gültigkeit).

Bewilligungsgebühr Gemeinde Rickenbach

CHF 50.-



**Aufgrabungen Schemaskizze / Arbeitsablauf**

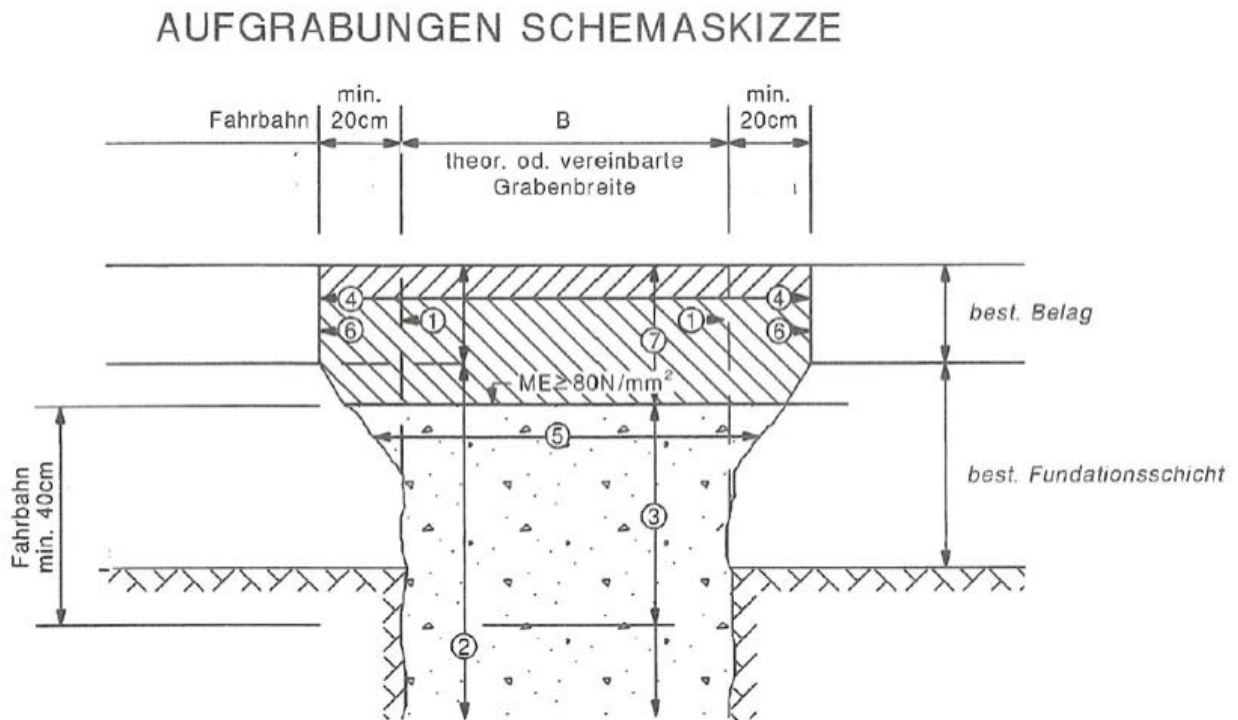

1. Belag anschneiden gemäss B
2. Belag entfernen / Grabenaushub / Verlegen der Leitung(en)
3. Grabenauffüllung schichtweise mit geeignetem Material (min. 40cm Kiessand in Fahrbahn)
4. Nachschneiden der Grabenränder (Fahrbahn min. je 20cm) Belag entfernen (zur Vermeidung von Hohlstellen). Reststellen von < 50cm müssen entfernt werden.
5. Ergänzende Grabenauffüllung / Erstellen der Planie (Verdichtungswert ME,  $\geq$ 80N/mm<sup>2</sup>)
6. Reinigen der Belagsränder / Auftragen eines schmelzbaren Bitumen-Fugenbandes.
7. Belagseinbau nach Regelfall

**Regelfall:** Anwendung in der warmen Jahreszeit, Monate April- Oktober.  
Witterungsbedingte Ausnahmen nach Absprache mit der Bewilligungsstelle.  
Temperatur der Unterlage für Deckschicht- Einbau  $\geq$ 10° C  
(siehe SN 640 430)
